

Panasonic warmtepomp lucht-lucht gamma comfort

Alle interventieaanvragen stuur je door via: service.admin.be@eu.panasonic.com
**Het aanvraagformulier moet vergezeld zijn van
 de vereiste documenten en van een ingevulde en ondertekende bestelbon.**

GEGEVENS VAN DE INSTALLATEUR

Bedrijfsnaam : Contactpersoon (Voornaam, Naam) :
 Telefoonnummer: E-mailadres :
 Adres :

GEGEVENS VAN DE EINDKLANT

Contactpersoon (Voornaam, Naam) :
 Telefoonnummer: E-mailadres :
 Adres :

OPMERKINGEN & SPECIFICATIES

.....

PRODUCTEN & BIJSTANDSPRESTATIES

Producten	Modellen		Opstarttarieven	x aantal=	total € excl. btw
	buitenunit	+ binnenunit			
Monosplit			€350		
Monosplit op dezelfde dag (max 3)			€300		
Multisplit – 2 of 3 sorties uitgangen			€500		
Multisplit – 4 of 5 sorties uitgangen			€590		
Multisplit – aantal binnenunits			€20		

Hoogte van de installatie van de buitenunit : meter Aantal systemen: systemen

Rescert certificaat nodig

VEREISTEN (aanvinken aub)

• Verplichte aanwezigheid van de installateur (en indien mogelijk de eindklant)


- Koelleidingen tussen binnen en buitenunit liggen klaar
- Er zitten geen knikken in de koelleidingen
- De uiteinden zijn vrij van lucht, vuil en vochtigheid
- Diameter van de koelleidingen voldoet aan de voorschriften
- Alle elektrische kabels zijn voorzien en aangesloten
- Diameter van de elektrische aansluiting voldoet aan de voorschriften

DATUM – DOCUMENT OVERHANDIGEN 15 DAGEN VOOR DE AANVANG VAN DE INTERVENTIE

Datum van de gewenste interventie:

Datum :

Panasonic warmtepomp lucht-lucht gamma comfort

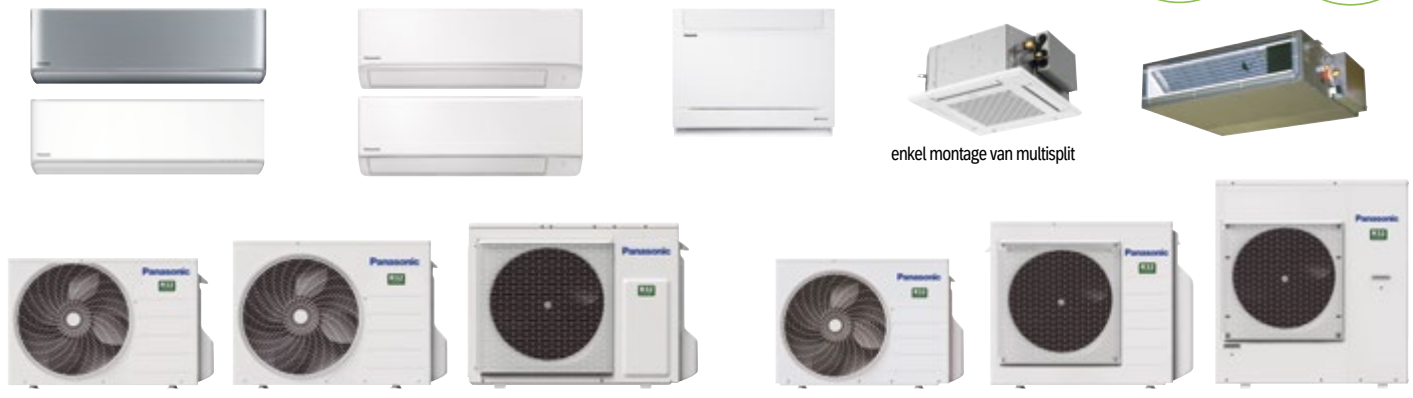

enkel montage van multisplit

Monosplit : Etherea Z, TZ, BZ, UBE (UFE et UD3)

Multisplit : Z Deluxe 2, 3, 4 en 5 uitgangen / TZ 2 & 3 uitgangen

Bijstandsprestaties lucht-lucht comfort

1. Elektriciteit

- Controle van de spanning
- Conformiteitscontrole
- Controle van de bedrading

2. Opstart

- Configuratie van de afstandsbediening
- Werkingscontrole

3. Koeltechnische bijstand

- Koeltechnisch aansluiten van de units (aanleggen van de leidingen en koppelingen)
- Proeftest
- Dichtheidstest met dichtheidscertificaat
- Vacumeren

Het leidingwerk moet in een wachtpositie worden geïnstalleerd, en alle elektrische- en communicatiebedrading moet zijn geïnstalleerd vóór de interventie.

Tarieven

Artikelcode	Omschrijving	Prijs € excl. btw
SVC-RAC-COMM-C1	Opstart Mono split	350
SVC-RAC-COMM-C2	Opstart tweede monosplit op dezelfde dag	300
SVC-RAC-COMM-C3	1 multisplit 2 /3 uitgangen	500
SVC-RAC-COMM-C4	1 multisplit 4 / 5 uitgangen	590

Belangrijk!

Elke interventie die minder dan 48 u op voorhand wordt geannuleerd of niet kan doorgaan wegens non-conformiteitsproblemen (i.v.m. de elektriciteit, de bedrading, het niet naleven van de richtlijnen van de producent, enz.) wordt gefactureerd aan de forfaitaire prijs van **€ 350 excl. btw.**

Als er extra koelmiddel nodig is, moet dit worden aangeleverd door de installateur. Indien de installateur dit niet kan voorzien, wordt het extra koelmiddel gefactureerd tegen onderstaande tarieven.

Andere bijstandsprestaties en tarieven

Aansluiting

Artikelcode	Omschrijving	Prijs € excl. btw
SVC-RAC-ITRS-INT	Instellen van interface RAC (Smart Cloud)	200

Pre-installatie /audit/ pechverhelping

SVC-RAC-PREP-U1	Pre-installatie ondersteuning RAC	250
SVC-RAC-REPA-HD	RAC-Interventie halve dag	330
SVC-RAC-REPA-D	RAC-Interventie hele dag	575

Tarieven koelmiddel

SVC-RAC-CONS-NI	Stikstof	80
SVC-RAC-CONS-R32	R32 (per kg)	50
SVC-RAC-CONS-R410A	R410A (per kg)	70

*Prijzen zijn indicatief, zie dagprijs
